


	Nombre	Duracion	Inicio
1		ADQUISICION DE BIENES POR SOLICITUD DE OFERTA NACIONAL REVISIÓN POSTERIOR	74 days	30/11/22 08:00 AM
2		Elaboración de Especificaciones técnicas y pliego de condiciones	2 days	30/11/22 08:00 AM
3		Publicación de anuncio específico de adquisiciones en el STEP, en SICOP y página de INCOPECA	1 day	02/12/22 08:00 AM
4		Recepción de Oferta técnicas y económicas	30 days	02/12/22 08:00 AM
5		Apertura de propuestas	0 days	12/01/23 08:00 AM
6		Evaluación de ofertas	5 days	12/01/23 08:00 AM
7		Aprobación de intención de adjudicar	2 days	19/01/23 08:00 AM
8		Notificación a oferentes de intención de adjudicar	1 day	23/01/23 08:00 AM
9		Plazo suspensivo	10 days	24/01/23 08:00 AM
10		Adjudicación del contrato	2 days	07/02/23 08:00 AM
11		Publicación de la adjudicación	1 day	09/02/23 08:00 AM
12		Confección del contrato	3 days	10/02/23 08:00 AM
13		Rendición de Garantía de cumplimiento	10 days	15/02/23 08:00 AM
14		Firma de contrato	3 days	01/03/23 08:00 AM
15		Refrendo Interno al contrato	5 days	06/03/23 08:00 AM
16		Emisión Orden de Orden de Compra	1 day	13/03/23 08:00 AM

Terminado	Predecesores	Observaciones	Responsables	4 abr 22							11 abr 22							18 abr 22							25 abr 22											
				M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M			
13/03/23 05:00 PM																																				
01/12/22 05:00 PM		METODO SDC CON REVISIÓ...	Roger López																																	
02/12/22 05:00 PM	2		Eliecer Leal																																	
12/01/23 05:00 PM	2		Eliecer Leal y Especialista Ad...																																	
12/01/23 08:00 AM	2		Eliécer Leal																																	
18/01/23 05:00 PM	5		Comisión de Licitaciones y R...																																	
20/01/23 05:00 PM	6																																			
23/01/23 05:00 PM	7		Eliecer Leal																																	
06/02/23 05:00 PM	8		Oferentes																																	
08/02/23 05:00 PM	9		Proveeduría - Presidencia																																	
09/02/23 05:00 PM	10		Proveeduría																																	
14/02/23 05:00 PM	11		Eliecer Leal y Especialista Ad...																																	
28/02/23 05:00 PM	12		Contratista y Presidente Eje...																																	
03/03/23 05:00 PM	13		Contratista																																	
10/03/23 05:00 PM	14		Guillermo Ramírez																																	
13/03/23 05:00 PM	15		Roger López																																	

	2 may 22				9 may 22				16 may 22				23 may 22				30 may 22				6 jun 22				13 jun 22				20 jun 22				27 jun 22														
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J					

			4 jul 22					11 jul 22					18 jul 22					25 jul 22					1 ago 22					8 ago 22					15 ago 22					22 ago 22					29 ago 22																																																																														
V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D																																			


--

5 sep 22				12 sep 22				19 sep 22				26 sep 22				3 oct 22				10 oct 22				17 oct 22				24 oct 22				31 oct 22																		
V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V								

7 nov 22					14 nov 22					21 nov 22					28 nov 22					5 dic 22					12 dic 22					19 dic 22					26 dic 22					2 ene 23																								
S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D



9 ene 23					16 ene 23					23 ene 23					30 ene 23					6 feb 23					13 feb 23					20 feb 23					27 feb 23					6 mar 23																							
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D

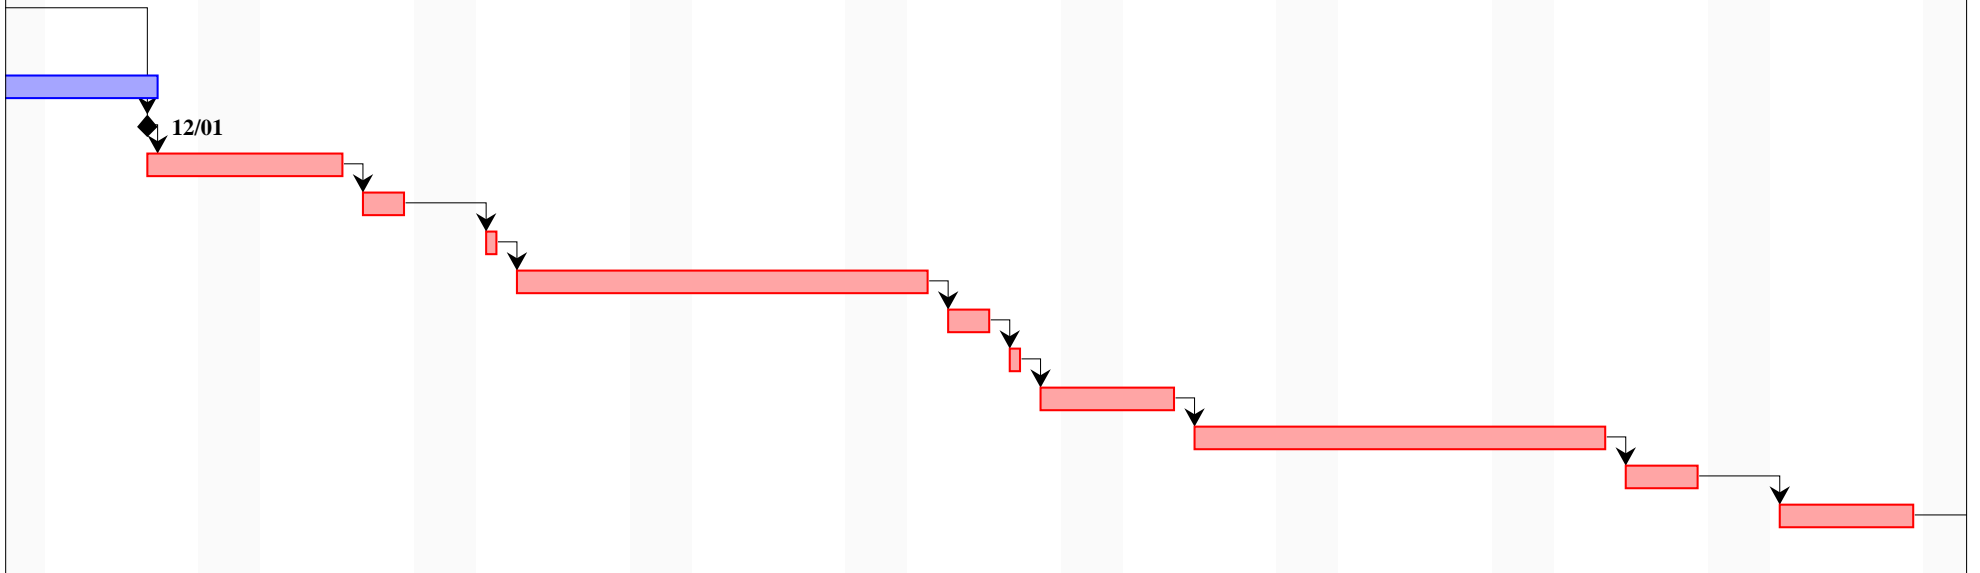

13 mar 23					20 mar 23					27 mar 23					3 abr 23					10 abr 23				
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
